



PROGRAMME DE PROMOTION DES REVENUS RURAUX TOAMASINA



PROGRAMME DE RESILIENCE AUX CRISES ALIMENTAIRES A MADAGASCAR (PARECAM)

RAPPORT DE SYNTHESE MAI 2009 –AVRIL 2011

Budget alloué	:	1 674 00 Euros
Pôles d'intervention	:	15
Communes touchées	:	23
Régions touchées	:	02
Ménages cibles	:	10 000



Résultat 1 : Les superficies aménagées favorable à l'intensification agricole céréalière et maraichère sont augmentées

Activités	Objectifs (ha)	Réalisations (ha)	Commentaires
Etudes, contrôle et surveillance des travaux	28	40	Superficie totale aménagée : 2004 hectares dont 681 ha de superficie drainée et 1324 ha de superficie irriguée Ménages bénéficiaires : 4860 Nombre AUE : 32 dont toutes formalisées (2 périmètres de 105 ha restant + 8 travaux de confortement de 490 ha))
Aménagement de périmètres	2034	2004	



Activité 1.2. Aménagement de périmètres maraichers

60 pompes à pédales avec kits couvrant 3000 m² en attente de livraison prévu pour début juin

45 hectares sont exploités en maraîchage.



Résultat 2 : Les cultures vivrières sont intensifiées et les pratiques agricoles et d'élevage modernisées

Activité 2.1. Rendre disponible les intrants (engrais, phytosanitaires)

Activités	Objectifs	Réalisations	Commentaires
Achat/distribution de semences Riz : Maïs : Haricot : CUMA :	20 t 15 t 10 t 200 kg	22,1 tonnes 41 ,28 tonnes 7,134 tonnes 4 607 sachets soit 46 kg et 50 kg oignon	2165 paysans ont bénéficié des semences améliorées en riz pluvial et irrigué.
Achat/distribution d'engrais ;	600 t	531 t de guanomad, 280 t NPK, 124 t de dolomie	La majorité des engrais achetés/distribués est liée à l'opération maïs



Grefe de manioc :
porte greffe (*manihot esculenta*)
greffon (*manihot glazovii*)



*Activité 2.1. Rendre disponible les intrants (engrais, phytosanitaires)
(suite)*

Activités	Objectifs	Réalisations	Commentaire
Achat/distribution des pesticides	1200 kg/litres	565 kg ITH, 1000 kg Pyriban, 193 litres agrimétrine	Les pesticides pour CUMA, et du riz pluvial. L'ITH pour opération maïs
Production d'engrais organiques	0 t	600 t	Production de 850 paysans adoptants

Activité 2.2. Soutenir l'utilisation des semences de qualité et leur multiplication

Activités	Objectifs	Réalisations	Commentaire
Appui à la production des semences	300 t	64,65 t	Les paysans semenciers n'ont plus continué l'activité
Production des cultivars de bananes	15 000	15 000	Plantation en phase de production
Production plants ignames	100 000	20 000	Livraison en cours
Production plants taros	100 000	7 000	

Activité 2.3. Appuyer la diffusion des petits équipements et matériels agri-élevage

Activités	Objectifs	Réalisations	Commentaires
Acquisition des matériels agricoles	2200	342	80 cannes planteuses et 112 sarcleuses, 120 arrosoirs, 30 pulvérisateurs

Activité 2.4. Micro-projet d'incitation de démonstration et de vulgarisation

Activités	Objectifs	Réalisations	Commentaires
Mise en place des champs écoles	30	45	Dont 18 groupements sur les cultures vivrières et 27 FFS pour la riziculture
Formation de proximité	5000	5842	2448 parmi les 5842 formés ont adopté les techniques dans leur parcelle sur les différents thèmes

Résultat 3 : Les filets de sécurité alimentaire sont renforcés et les revenus sont améliorés par l'organisation des marchés de produits vivriers

Activités	Objectifs	Réalisations	Commentaires
Construction GCV et magasin de stockage communautaire	150 t	440 t	Travaux de réhabilitation de 2 KPSV en cours (1000 t)
Formation en gestion des GCV	2 sessions	6 sessions	Collaboration avec OTIV sur le stockage à crédit, Formation des membres des COGES sur les techniques de gestion des magasins et en comptabilité simplifiée.

Activité 3.2. Accompagner la production et le stockage villageois par des produits financiers spécifiques

Activités	Objectifs	Réalisations	Commentaires
Encadrement à la contractualisation avec l'IMF	15	15	5 caisses se trouvant dans la zone où les paysans s'intéressent au crédit stockage 20 GCV sont ciblés pour la campagne en cours.
Fonds de roulement intrants	15	0	Non entamé

Activité 3.3. Promotion de la négociation entre les associations de producteurs et collecteurs/commerçants et mise en réseaux

Activités	Objectifs	Réalisations	Commentaires
Encadrement au développement de partenariat	14 CAM	10 CAM	10 CAM touchés
Dotation des fonds 25000 Euros aux Centres d'Accès au Marché comme fonds revolving	14 CAM	10 CAM	191,4T de paddy collectés et 70,6T de maïs, 780 paysans participants. Fonds à réutiliser pour la campagne actuelle.

Communication

Participation à l'élaboration du plan de communication

Production d'un article


Production des fiches techniques de production

Animation avec des marionnettes

Mise en place des panneaux de signalisation

SITUATION FINANCIERE PARECAM/ PPRR AU 30 Avril 2011 PAR COMPOSANTE EN EUROS

RESULTATS ET ACTIVITES DETAILLEES DE PARECAM	TOTAL BUDGET INITIAL 2009 -2011 en €	TOTAL BUDGET MODIFIE 2009 -2011	CUMUL de Décaissement au 30/04/11	% DE DECAISSEMENT AU 30/04/11	ENGAGEMENT AU 30/04/11	CUMUL avec ENGAGEMENT au 30/04/11	% REALISATION AVEC ENGAGEMENT au 30/04/11
Résultat 1: les superficies aménagées favorable à l'intensification agricole céréalière et maraichère sont augmentées							
TOTAL RESULTAT 1	527 800,00	551 393,27	507 024,71	91,95%	182 727,78	689 752,49	125,09%
Résultat 2 : les cultures vivrières sont intensifiées et les pratiques agricoles et d'élevage modernisées							
TOTAL RESULTAT 2	272 280,00	637 058,74	530 984,96	83,35%	13 833,99	544 818,95	85,52%
Résultat 3: les filets de sécurité alimentaire sont renforcés et les revenus sont améliorés par l'organisation des marchés de produits vivriers							
TOTAL RESULTAT 3	204 050,00	225 468,07	138 565,23	61,46%	79 554,65	218 119,88	96,74%
Résultat 4: les méthodes sont pérennisées par les services agricoles et l'intégration institutionnelle est assurée au niveau du PSA.							
TOTAL RESULTAT 4	190 070,00	260 079,92	187 397,76	72,05%	8 106,35	195 504,11	75,17%
GRAND TOTAL PAR PROJET	1 194 200,00	1 674 000,00	1 363 972,66	81,48%	284 222,77	1 648 195,43	98,46%

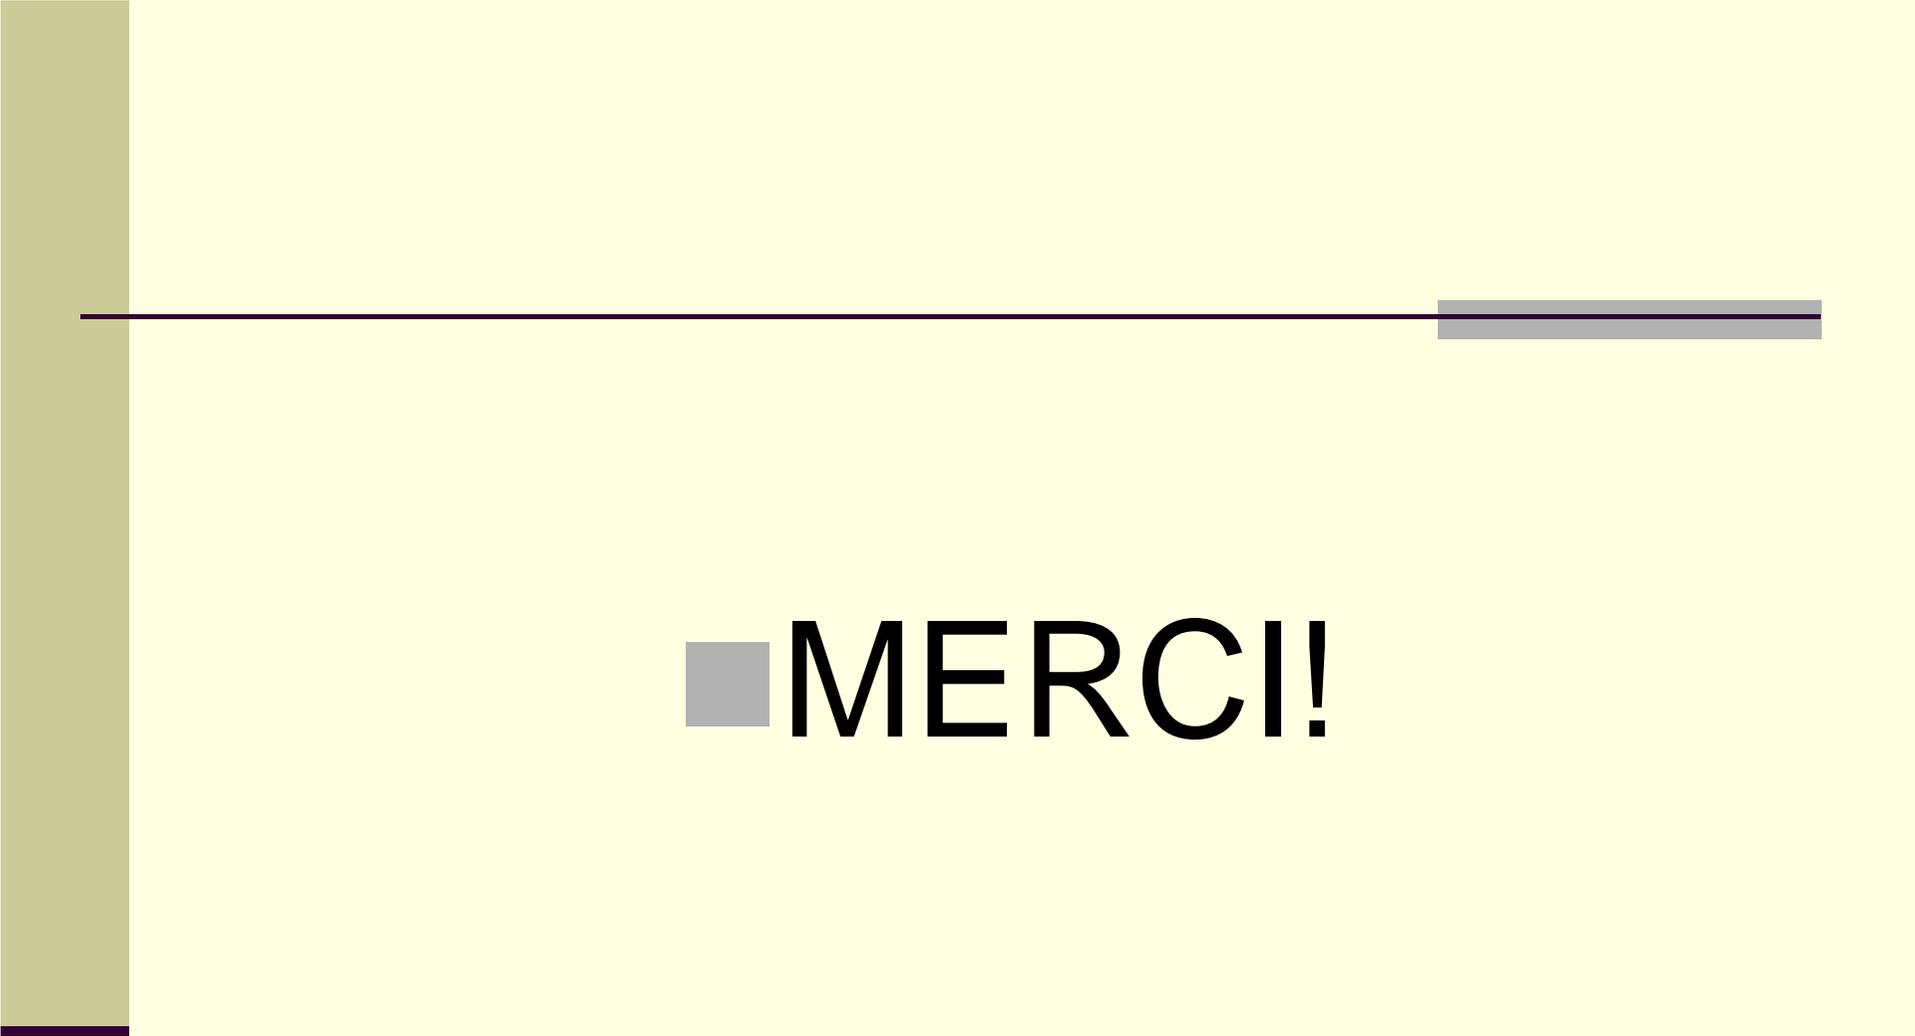

■ **MERCI!**
